

# Relatório de Transição de Governo

Secretaria de Infraestrutura Rural e  
Urbana e de Serviços Públicos



# Departamento de Obras Públicas

O Departamento de Obras Públicas é responsável pelo gerenciamento e fiscalização de toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público de execução direta ou indireta da Administração Pública Municipal.

Compete aos servidores lotados neste Departamento a gestão, controle e monitoramento da execução financeiras dos contratos assumidos, além da análise e justificativa em caso de re-programação da obras. Garantido que os recursos sejam aplicados e as especificações técnicas sejam aplicados de forma adequada dentro dos prazos estipulados.



- + DE 200 OBRAS FISCALIZADAS E CONCLUÍDAS DESDE 2022
- 97 ORDENS DE SERVIÇOS EMITIDAS EM 2023
- 76 ORDENS DE SERVIÇOS EMITIDAS EM 2024 (ATÉ 30/11/24)

- R\$ 25.860.590,40  
REAIS DE OBRAS EM  
ANDAMENTO
- R\$ 798.959,19 REAIS  
DE SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA EM  
ANDAMENTO (*EXCETO  
CONTINUADOS*)
- + DE R\$ 18.000.000,00  
REAIS MEDIDOS DOS  
CONTRATOS  
VIGENTES DE OBRAS  
E SERVIÇOS



# OBRAS EM EXECUÇÃO

## SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	CRONOGRAMA EXECUTADO	DATA DA MEDIÇÃO	STATUS DA OBRA
DISPENSA Nº 39/2024	URBANIZAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO LUIZ DO OESTE	21/04/2025	04/11/2025	R\$ 4.891.437,04	21,43%	27/11/2024	ATRASADA
DISPENSA Nº 38/2024	URBANIZAÇÃO DA RUA WALDEMAR GRAHL E DA RUA DIONISIO FALBOTA (PROJETO PILOTO BIM)	16/01/2025	01/05/2025	R\$ 845.361,84	94,10%	27/11/2024	ADIANTADA
DISPENSA Nº 29/2024	ROTATÓRIA NA INTERSECÇÃO DA RUA CARLOS SBARAINI X PR-585 (DER-PR)	10/01/2025*	24/03/2025*	R\$ 1.006.407,41	33,12%	27/11/2024	ATRASADA
DISPENSA Nº 91/2023	URBANIZAÇÃO DA RUA ESTEFANO SECCHI E ROTATÓRIA COM RUA CARLOS BARBOSA	18/12/2024	22/04/2025	R\$ 2.489.792,15	92,10%	29/10/2024	ATRASADA
CONCORRÊNCIA Nº 3/2023	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E PASSARELA SOBRE O RIO MARRECO NO JARDIM COOPAGRO	19/12/2024	03/04/2025	R\$ 5.436.522,41	78,28%	27/11/2024	ATRASADA
DISPENSA Nº 20/2024	EXECUÇÃO DE EMISSÁRIO DE ÁGUAS PLUVIAS NA RUA SANGA BRANCA	14/12/2024	12/05/2025	R\$ 2.533.907,22	50,08%	27/11/2024	ATRASADA

### NOTAS:

- Dispensa de Licitação nº 39/2024 irá conectar com contratação dos emissários de galerias pluviais a serem contratados;
- Dispensa de Licitação nº 38/2024 com tramitação de aditivo de serviços em aproximadamente R\$ 40.000,00 reais;
- Dispensa de Licitação nº 29/2024 aguarda formalização do termo aditivo com datas acima atualizadas, mas já possui decisão administrativa;
- Dispensa de Licitação nº 91/2023 com tramitação de aditivo de serviços em aproximadamente R\$ 210.000,00 reais e 120 dias de prazo de execução;
- Concorrência nº 3/2023 com tramitação de aditivo de prazo de execução na obra em até 90 dias;
- Dispensa de Licitação nº 20/2024 com tramitação de aditivo de prazo de execução na obra em até 90 dias.

# OBRAS EM EXECUÇÃO

## SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	CRONOGRAMA EXECUTADO	DATA DA MEDIÇÃO	STATUS DA OBRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2023	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LINHA MANDARINA	12/01/2025*	12/05/2025*	R\$ 914.474,70*	82,01%	19/06/2024	PARALISADA
DISPENSA Nº 49/2024	REVITALIZAÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CRISTO REI E JARDIM DA SAUDADE	15/12/2024	06/02/2025	R\$ 155.374,88	78,05%	29/10/2024	ATRASADA
DISPENSA Nº 17/2024	REURBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PARIGOT DE SOUZA – 3ª ETAPA	24/11/2024	27/04/2025	R\$ 633.350,21	96,14%	27/11/2024	ATRASADA

### NOTAS:

- Tomada de Preços nº 8/2023 aguarda formalização do termo aditivo com valores e datas acima atualizados, mas já possui decisão administrativa;
- Dispensa de Licitação nº 49/2024 é caracterizado como serviço comum de engenharia;
- Dispensa de Licitação nº 17/2024 com tramitação de aditivo de serviços em aproximadamente R\$ 6.000,00 reais e 30 dias de prazo de execução.


### 3ª ETAPA:

Trecho entre a Av. Nossa Sra. De Fátima e a Av. Rio Grande Sul + 2 Rotatórias da Av. Parigot x Rua Saturno e Av. Parigot x Av. Nossa Sra. De Fátima

### SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	CRONOGRAMA EXECUTADO
DISPENSA Nº 28/2024	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	23/06/2025	R\$ 4.870.598,33	7,04%
DISPENSA Nº 34/2024	SERVIÇOS CONTINUADOS DE TAPA-BURACOS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	10/07/2025	R\$ 26.094.190,82	18,18%

## PONTE DO RIO MARRECO




**REURBANIZAÇÃO  
CANTEIRO CENTRAL AV.  
PARIGOT DE SOUZA**



**ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA  
LINHA MANDARINA**



**URBANIZAÇÃO RUA  
ESTEFANO SECCHI**



**URBANIZAÇÃO RUAS  
WALDEMAR GRAHL E  
DIONISIO FALBOTA**

# OBRAS EM EXECUÇÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	CRONOGRAMA EXECUTADO	DATA DA MEDIÇÃO	STATUS DA OBRA
CONCORRÊNCIA Nº 1/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FRIEDRICH	21/06/2025	01/12/2025	R\$ 3.280.000,00	62,41%	29/10/2024	ADIANTADA
DISPENSA Nº 30/2024	FINALIZAÇÃO DO CMEI DO BAIRRO PINHEIRINHO – PADRÃO FNDE	11/01/2025	23/03/2025	R\$ 257.888,53	61,11%	19/11/2024	ATRASADA
CONCORRÊNCIA Nº 4/2024	FINALIZAÇÃO DO CMEI DO JARDIM DA MATA – PADRÃO FNDE	17/01/2025	03/04/2025	R\$ 769.900,00	4,11%	31/10/2024	ATRASADA
DISPENSA Nº 35/2024	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS – 2ª ETAPA	06/03/2025	24/04/2025	R\$ 643.584,31	56,55%	27/11/2024	ADIANTADA

### 2ª ETAPA:

Escola Municipal Miguel Dewes  
Escola Municipal Anita Garibaldi  
Escola Municipal Amélio Dal Bosco  
Escola Municipal Jardim Concórdia  
Escola Municipal Norma Demeneck Belotto  
Escola Municipal Professor Henrique Brod  
Escola Municipal São Francisco de Assis

### NOTAS:

- Concorrência nº 1/2023 com tramitação de aditivo de serviços no valor de R\$ 124.099,60 reais;
- Dispensa de Licitação nº 30/2024 com tramitação de aditivo de serviços no valor de R\$ 19.960,75 reais;
- Concorrência nº 4/2024 com tramitação de aditivo de serviços no valor de R\$ 79.691,05 reais;
- Dispensa de Licitação nº 35/2024 é **serviço comum de engenharia** e está com tramitação de aditivo de serviços no valor de R\$ 3.855,14 reais.

# ESCOLA CARLOS FRIEDRICH



**CMEI PINHEIRINHO**



**CMEI JARDIM DA MATA**



# OBRAS EM EXECUÇÃO

## GABINETE DO PREFEITO / ASSESSORIA COMUNITÁRIA:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	CRONOGRAMA EXECUTADO	DATA DA MEDIÇÃO	STATUS DA OBRA
CONCORRÊNCIA Nº 06/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO "NOSSA SENHORA DE LOURDES" NO JARDIM PORTO ALEGRE	25/07/2025	01/09/2025	R\$ 1.309.000,00	6,67%	01/11/2024	EM DIA

## SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	CRONOGRAMA EXECUTADO	DATA DA O.S.	STATUS DA OBRA
CONCORRÊNCIA Nº 08/2024	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO LOTEAMENTO EGON PUDELL	18/04/2025	09/10/2025	R\$ 643.000,00	21,53%	28/11/2024	ADIANTADA



**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO  
COMUNITÁRIO DO JARDIM PORTO  
ALEGRE**



**PASSEIO PÚBLICO NO  
LOTEAMENTO EGON PUDELL**



# OBRAS EM EXECUÇÃO

## SECRETARIA DA SAÚDE:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	CRONOGRAMA EXECUTADO	DATA DA O.S.	STATUS DA OBRA
CONCORRÊNCIA Nº 12/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ENDEMIAS	17/02/2025	22/04/2025	R\$ 176.860,90	0,00%	19/11/2024	INICIANDO

## SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	CRONOGRAMA EXECUTADO	DATA DA O.S.	STATUS DA OBRA
CONCORRÊNCIA Nº 07/2024	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO DO JARDIM GISELA	18/05/2025	23/10/2025	R\$ 422.687,99	0,00%	19/11/2024	INICIANDO

## SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	CRONOGRAMA EXECUTADO	DATA DA O.S.	STATUS DA OBRA
CONCORRÊNCIA Nº 09/2024	CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO NO CRAS V ANEXO AO CEU DAS ARTES (PROJETO PILOTO BIM)	150 DIAS	11/05/2025	R\$ 250.000,00	0,00%	-	AGUARDANDO ALVARÁ

# OUTROS CONTRATOS FISCALIZADOS:

## SECRETARIA DA CULTURA:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 40/2024	LAUDO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE TOLEDO	30/12/2024	29/01/2025	R\$ 33.900,00

## SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2024	MAPEAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS GEORREFERENCIADAS E ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE MICRO E MACRODRENAGEM URBANA	18 meses	15/10/2026	R\$ 3.998.600,00

## CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO:

LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	APOIO TÉCNICO
PREGÃO Nº 1/2023	OUTSORCING PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS DA CÂMARA MUNICIPAL	Conforme demandas


# DEMANDAS DE OBRAS À CONTRATAR:

- Ampliação de Rede Elétrica na Rua Waldemar Grahl e Rua Dionísio Falbota (Complementar a urbanização em execução);
- Emissário/Conexão de Galeria Pluvial da Rua Waldemar Grahl (Complementar a urbanização em execução);
- Emissários no Distrito de São Luiz do Oeste (Complementar a urbanização em execução);
- Implantação de Parque Infantil Grande no Parque dos Pioneiros ;
- Ampliação de Rede Elétrica no Lote Social e Prolongamento da Rua João Orestes Ruaro;
- Reurbanização do Canteiro Central Av. Parigot de Souza - Ciclovia 4ª Etapa;
- Emissário no Distrito de Vila Nova (Obra com Procedimento Comum Cível Auto nº 11414-85.2019.8.16.0170 da 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE TOLEDO);
- Emissário na Rua Pedro Alvares Cabral (Jardim Concórdia) (Obra com Inquérito Cível MPPR0148.17.000599-2 da 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOLEDO);
- Retomada da construção de Ciclovia na OT 007 - Entre Av. Ministro Cirne Lima (Toledo) x Distrito de Novo Sobradinho;
- Reurbanização da Avenida Ministro Cirne Lima - 1ª Etapa: Rua João Orestes Ruaro x Trevo da PR-467;
- Deslocamento da Rede Elétrica COPEL na Av. Ministro Cirne Lima;
- Ampliação de Galeria Pluvial na Av. Ministro Cirne Lima;
- Revitalização do Parque Urbano Lino Gotardo Pizzatto - Jardim Panorama;
- Pavimentação da Rua Dr. Cid Marcondes de Albuquerque - Em frente ao Parque Urbano Lino Gotardo Pizzatto;
- Emissário no Rio Lopeí em Bom Princípio do Oeste;
- Emissário da Rua Marechal Floriano no Centro;
- Construção de Rotatória entre a Rua 1ª de Maio x Avenida Egydio Munaretto x Rua Mario Fontana;
- Contratação de abertura de poços de visita e caixas de ligação de galerias pluviais lacradas (Auxílio ao contrato de mapeamento contratado).

# Chamados Internos de Manutenção Predial

	Ano base	Elétrica	Hidráulica	Manutenção	Total
Chamados	2021	N/A	N/A	N/A	N/A
	2022	738	1069	38	1.845
	2023	940	885	88	1.913
	2024*	782	958	300	2.040

Dados de janeiro de 2021 a outubro de 2024\*

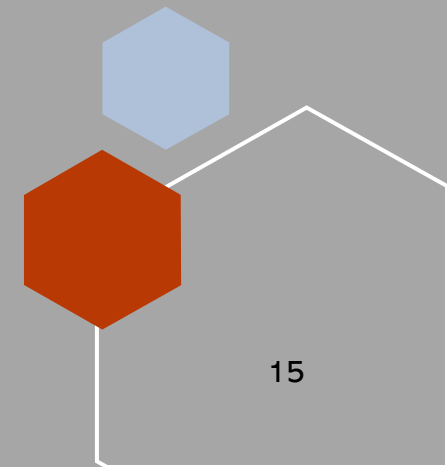

# DEFESA CIVIL (Operacional)



A Defesa Civil é um conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação para emergências, resposta e recuperação. São atividades realizadas permanentemente nos estados, municípios e no Distrito Federal para evitar desastres e minimizar seus efeitos.



# Fechamento

A Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos, por meio de sua gestão, tem buscado, eficiência, fiscalização rigorosa e parcerias estratégicas, atuando para melhorar a infraestrutura de Toledo, promovendo o desenvolvimento sustentável e proporcionando o bem-estar da comunidade.

Ao coordenar obras públicas, gerenciar recursos e realizar serviços essenciais de manutenção, a Secretaria contribui significativamente para uma cidade organizada, segura e preparada para atender às demandas de seus cidadãos.



# Obrigado

Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana e de  
Serviços Públicos

[infraruraleurbana@toledo.pr.gov.br](mailto:infraruraleurbana@toledo.pr.gov.br)

[administrativo.infra@toledo.pr.gov.br](mailto:administrativo.infra@toledo.pr.gov.br)

[almoxarifado.infra@toledo.pr.gov.br](mailto:almoxarifado.infra@toledo.pr.gov.br)

[obraspublicas.infra@toledo.pr.gov.br](mailto:obraspublicas.infra@toledo.pr.gov.br)

[obras.posturas@toledo.pr.gov.br](mailto:obras.posturas@toledo.pr.gov.br)

[limpezapublica.infra@toledo.pr.gov.br](mailto:limpezapublica.infra@toledo.pr.gov.br)

[patiodemaquinas@toledo.pr.gov.br](mailto:patiodemaquinas@toledo.pr.gov.br)

(45) 3196-2940

Redes Sociais: @infra.toledo

